

SPRAWOZDANIE



z wykonania robót konserwacyjnych urządzeń
melioracji wodnej szczegółowej na terenie
działania Gminnej Spółki Wodnej Brodnica
w 2012 roku

Opracował:

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH
63-100 ŚREM, UL. OGRODOWA 39
KIEROWNIK
inż. Wiesław Klak

Grudzień 2012

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE

Roboty wykonano na podstawie umowy zawartej w dniu 31.05.2012r. pomiędzy Gminą Brodnica, z siedzibą w Brodnicy 41, 63-112 Brodnica, a Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych z siedzibą w Śremie, ul. Ogrodowa 39, 63-100 Śrem.

1. Rozliczenie finansowe:

1.1. Plan finansowy	77.000,00 zł
1.2. Wykonanie finansowe	80.423,96 zł
1.3. Wykonanie finansowe z dotacji	46.000,00 zł
1.4. Wykonanie finansowe ze środków GSW	34.423,96 zł

2. Rozliczenie rzeczowe:

2.1. Plan rzeczowy	3050 mb
2.2. Wykonanie rzeczowe	5400 m

I. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-11-18 w m. Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb

Roboty wykonywane w okresie od 03.09.2012r. do 05.09.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	570
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	m ²	1908
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	1908
4	Mechaniczne odmulenie	m	450
5	Studzienka kontrolna	szt	1

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	1108,50
2	Wykoszenie porostów ze skarp	590,34
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	181,64
4	Mechaniczne odmulenie	4014,72
5	Studzienka kontrolna	2204,64
ŁĄCZNIE		8099,84

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-01-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Brodnica-Sulejewo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-11-18
Lokalizacja: Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budów kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **8 099,84**
Słownie: **osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 84/100**

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-01-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Brodnica-Sulejewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-11-18
 Lokalizacja: Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-01-001 Strona 1 18-12-2012

SYKAL-00265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu Sz-G-11-18 L=450 mb		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,057
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia krzaków do wycięcia		$135,0 * (2,12 + 2,12) * 0,0001$
					0,057
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1908,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia skarp		$450,0 * (2,12 + 2,12)$
					1908,000
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1908,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	450,000
1	160	KSNR S010-12-02-02-00	Studzienka kontrolna S-1 o 1000 głęb 2,0 m	szt	1,000

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-01-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Brodnica-Sulejewo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-11-18
 Lokalizacja: Brodnica-Sulejewo gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-01-001		Strona 1			18-12-2012
					SYKAL-002365
DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				Razem	8 099,84
1	Konserwacja rowu Sz-G-11-18 L=450 mb				
1	10 WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gestych	HA	0,057	19 447,38	1 108,50
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Piła motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem		K. Bezpośrednie	11 439,63	
			K. Pośr 70,0%	8 007,74	
	Razem		Pozycja	19 447,38	
1	20 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1908,000	0,31	590,34
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem		K. Bezpośrednie	0,18	
			K. Pośr 70,0%	0,13	
	Razem		Pozycja	0,31	
1	30 KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1908,000	0,10	181,64
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560
				R	0,06
	Razem		K. Bezpośrednie	0,06	
			K. Pośr 70,0%	0,04	
	Razem		Pozycja	0,10	
1	70 KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	450,000	8,92	4 014,72
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
				S	5,25
	Razem		K. Bezpośrednie	5,25	
			K. Pośr 70,0%	3,67	
	Razem		Pozycja	8,92	
1	160 KSNR S010-12-02-02-00 Studzienka kontrolna S-1 o 1000 głęb 2,0 m	szt	1,000	2 204,64	2 204,64
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	58,30000	14,00	816,2000
				R	816,20
	Pokrywa nadstudzienna żelbet o 1000/600	szt	1,00000	66,00	66,0000
				M	66,00
	Koszty zakupu i transportu	%	10,000		6,6000
				T	6,60

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Ciągnik kołowy 50 KM	m-godz	1,46000	65,00	94,9000
	Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg	m-godz	1,44000	16,00	23,0400
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	4,00000	80,00	320,0000
					<u>S</u> 437,94
	Razem	K. Bezpośrednie			1 326,74
		K. Pośr 70,0%			877,90
	Razem	Pozycja			<u>2 204,64</u>
OGÓLEM KOSZTORYS 004-01-001					8 099,84



II. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A w m. Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 300mb

Roboty wykonywane w okresie od 26.06.2012r. do 31.07.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	640
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	m ²	1272
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	1272
4	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	1244,63
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	393,56
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	121,09
4	Mechaniczne odmulenie	2341,92
ŁĄCZNIE		4101,20

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-02-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Brodniczka-Esterpole
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
Lokalizacja: Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny	Stawki budowlane kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej	14,00
poziom cen materiałów	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%

Wartość robót netto: **4 101,20**
Słownie: **cztery tysiące sto jeden 20/100**

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-02-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Brodniczka-Esterpole
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
 Lokalizacja: Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-02-001 Strona 1 18-12-2012

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-A L=300 mb		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,064
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		0,064
			<i>Obliczenie ilości</i> 150,0*(2,12+2,12)*0,0001		
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1272,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia skarp		1272,000
			<i>Obliczenie ilości</i> 300,0*(2,12+2,12)		
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1272,000
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	300,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-02-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Brodniczka-Esterpole
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
 Lokalizacja: Brodniczka-Esterpole gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-02-001		Strona 1			18-12-2012
DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				Razem	4 101,20
1	Konserwacja rowu R-A L=300 mb				
1	10 WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,064	19 447,38	1 244,63
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
	Razem	K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1	20 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1272,000	0,31	393,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
	Razem	K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem	Pozycja			0,31
1	30 KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1272,000	0,10	121,09
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560
				R	0,06
	Razem	K. Bezpośrednie			0,06
	Razem	K. Pośr 70,0%			0,04
	Razem	Pozycja			0,10
1	50 KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0.80 m	metr	300,000	7,81	2 341,92
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
				S	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie			4,59
	Razem	K. Pośr 70,0%			3,21
	Razem	Pozycja			7,81
OGÓLEM KOSZTORYS 004-02-001					4 101,20



III. Konserwacja rowu melioracyjnego nr Sz-G-17, Sz-G-7 w m. Górka-Żurawiec gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 300mb

Roboty wykonywane w okresie od 10.10.2012r. do 11.10.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	190
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	m ²	1272
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	1272
4	Mechaniczne odmulenie	m	300

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	369,50
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	393,56
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	121,09
4	Mechaniczne odmulenie	2676,48
ŁĄCZNIE		3560,63

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-03-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Górką-Żurawiec
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-17, Sz-G-7
Lokalizacja: Górką-Żurawiec gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budow kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **3 560,63**
Słownie: **trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt 63/100**

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-03-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Górka-Żurawiec
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-17, Sz-G-7
 Lokalizacja: Górka-Żurawiec gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-03-001 Strona 1 18-12-2012

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu Sz-G-17 L=150 mb, Sz-G-7 L=150 mb		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,019
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia krzaków do wycięcia		$(150,0 * (2,12 + 2,12) * 0,0001) * 0,30$
					0,019
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1272,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia skarp		$150,0 * (2,12 + 2,12)$
		2	Powierzchnia skarp		$150,0 * (2,12 + 2,12)$
					636,000
					636,000
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1272,000
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	300,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-03-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Górka-Żurawiec
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr Sz-G-17, Sz-G-7
 Lokalizacja: Górka-Żurawiec gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-03-001		Strona 1			18-12-2012	
DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
I	Konserwacja rowu Sz-G-17 L=150 mb, Sz-G-7 L=150 mb			Razem	3 560,63	
I 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,019	19 447,38	369,50	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000	
					R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 km	m-godz	0,08170	10,00	0,8170	
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170	
					S	1,63
	Razem		K. Bezpośrednie			11 439,63
			K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem		Pozycja			19 447,38
I 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1272,000	0,31	393,56	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820	
					R	0,18
	Razem		K. Bezpośrednie			0,18
			K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem		Pozycja			0,31
I 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1272,000	0,10	121,09	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560	
					R	0,06
	Razem		K. Bezpośrednie			0,06
			K. Pośr 70,0%			0,04
	Razem		Pozycja			0,10
I 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	300,000	8,92	2 676,48	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Koparko-ładowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480	
					S	5,25
	Razem		K. Bezpośrednie			5,25
			K. Pośr 70,0%			3,67
	Razem		Pozycja			8,92
OGÓLEM KOSZTORYS 004-03-001					3 560,63	

11.11.1971



11.11.1971



IV. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-H w m. Grzybno gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 450mb

Roboty wykonywane w okresie od 23.10.2012r. do 26.10.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	760
2	Wykoszenie porostów kosiarka bijakową wysięgnikową na ciągniku- skarpa, dno ciek	m ²	450
3	Mechaniczne odmulenie	m	450

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	1478,00
2	Wykoszenie porostów kosiarka bijakową wysięgnikową na ciągniku- skarpa, dno ciek	202,88
3	Mechaniczne odmulenie	4516,56
ŁĄCZNIE		6197,44

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-04-001

Budowa: Gmina Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Grzybno
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-H
 Lokalizacja: Grzybno gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-04-001

Strona 1

18-12-2012

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-H L=450 mb		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,076
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia krzaków do wycięcia		<i>Obliczenie ilości</i> 180,0*(2,12+2,12)*0,0001
					0,076
1	40	KNR 1501-01-14-09-00	Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	450,000
1	60	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	450,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-04-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Grzybno
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-H
Lokalizacja: Grzybno gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budów kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **6 197,44**
Słownie: *sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem 44/100*

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-04-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Grzybno
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-H
 Lokalizacja: Grzybno gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-04-001

Strona 1

18-12-2012

SYKAL-002265

DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-H L=450 mb			Razem	6 197,44
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,076	19 447,38	1 478,00
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 40	KNR 1501-01-14-09-00 Wykoszenie porostów kosiarką na ciągniku skarpa,dno ciek	m ²	450,000	0,45	202,88
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Kosiarka bijakowa wysięgnikowa	m-godz	0,00260	37,00	0,0962
	Ciągnik kołowy 30 KM	m-godz	0,00260	65,00	0,1690
				S	0,27
	Razem	K. Bezpośrednie			0,27
		K. Pośr 70,0%			0,19
	Razem	Pozycja			0,45
1 60	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciek szer 0,80 m	metr	450,000	10,04	4 516,56
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka kołowa CAT	m-godz	0,06560	90,00	5,9040
				S	5,90
	Razem	K. Bezpośrednie			5,90
		K. Pośr 70,0%			4,13
	Razem	Pozycja			10,04
OGÓLEM KOSZTORYS 004-04-001					6 197,44



V. Konserwacja rowu melioracyjnego nr P-J-14-1 w m. Hówiec Wielki gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 550mb

Roboty wykonywane w okresie od 12.11.2012r. do 19.11.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	2330
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	m ²	2332
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	2332
4	Mechaniczne odmulenie	m	225
5	Oczyszczenie przepustu	m	4

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	4531,24
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	721,52
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	222,01
4	Mechaniczne odmulenie	3763,80
5	Oczyszczenie przepustu	190,40
ŁĄCZNIE		9428,97

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-05-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Hówiec Wielki
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr P-J-14-1
Lokalizacja: Hówiec Wielki gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budów kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **9 428,97**
Słownie: **dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem 97/100**

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-05-001


Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Iłowiec Wielki
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr P-J-14-1
 Lokalizacja: Iłowiec Wielki gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-05-001		Strona 1		18-12-2012		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ	
1		Konserwacja rowu P-J-14-1 L=550 mb				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,233	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia krzaków do wycięcia		550,0*(2,12+2,12)*0,0001	
					0,233	
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2332,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarp		550,0*(2,12+2,12)	
					2332,000	
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	2332,000	
1	70	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	225,000	
1	100	KNR 1501-01-08-02-01	Oczyszczenie przepustu rurowego F1 5,0 m namul głęb 1/2	metr	4,000	

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-05-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Iłówiec Wielki
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr P-J-14-1
 Lokalizacja: Iłówiec Wielki gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-05-001		Strona I			18-12-2012
DZ. POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
				Razem	9 428,97
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,233	19 447,38	4 531,24
<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11 438,0000
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 KM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				<u>S</u>	<u>1,63</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			<u>8 007,74</u>
	Razem	Pozycja			<u>19 447,38</u>
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	2332,000	0,31	721,52
<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				<u>R</u>	<u>0,18</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		K. Pośr 70,0%			<u>0,13</u>
	Razem	Pozycja			<u>0,31</u>
1 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykoszu porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	2332,000	0,10	222,01
<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560
				<u>R</u>	<u>0,06</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			0,06
		K. Pośr 70,0%			<u>0,04</u>
	Razem	Pozycja			<u>0,10</u>
1 70	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	225,000	16,73	3 763,80
<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	0,06560	80,00	5,2480
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
				<u>S</u>	<u>9,84</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			9,84
		K. Pośr 70,0%			<u>6,89</u>
	Razem	Pozycja			<u>16,73</u>
1 100	KNR 1501-01-08-02-01 Oczyszczenie przepustu rurowego FI 5,0 m namul głęb 1/2	metr	4,000	47,60	190,40
<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,00000	14,00	28,0000
				<u>R</u>	<u>28,00</u>
	Razem	K. Bezpośrednie			28,00
		K. Pośr 70,0%			<u>19,60</u>
	Razem	Pozycja			<u>47,60</u>

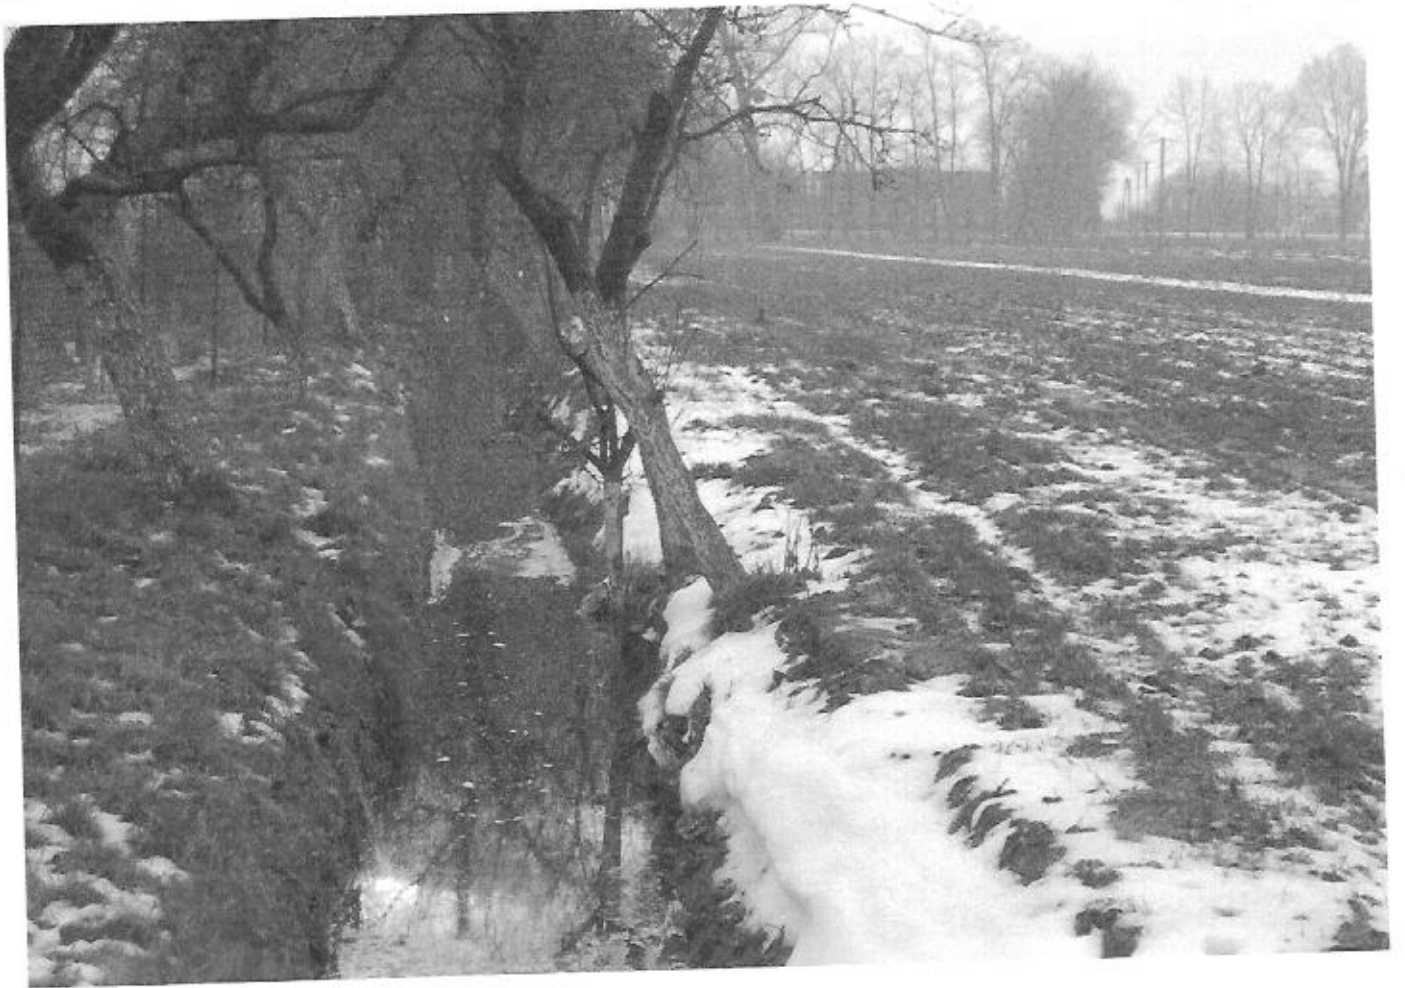

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓLEM KOSZTORYS 004-05-001					9 428,97

VI. Konserwacja rowu melioracyjnego nr W-5-1 w m. Jaskowo-Ludwikowo gm. Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 250mb

Roboty wykonywane w okresie od 23.04.2012r. do 30.04.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	320
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	m ²	1060
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	1060
4	Mechaniczne odmulenie	m	250
5	Oczyszczenie przepustu	m	10
6	Studzienka kontrolna	szt	1

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	622,32
2	Wykoszenie porostów ręczne ze skarp	327,96
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100,91
4	Mechaniczne odmulenie	1951,60
5	Oczyszczenie przepustu	476,00
6	Studzienka kontrolna	2691,06
ŁĄCZNIE		6169,85

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-06-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Jaskowo-Ludwikowo
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr W-5-1
Lokalizacja: Jaskowo-Ludwikowo gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budowlane kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **6 169,85**
Słownie: **sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 85/100**

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-06-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Jaskowo-Ludwikowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr W-5-1
 Lokalizacja: Jaskowo-Ludwikowo gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-06-001		Strona 1		18-12-2012		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		Konserwacja rowu W-5-1 L=250 mb				
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,032	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia krzaków do wycięcia		$(250,0 * (2,12 + 2,12) * 0,0001) * 0,30$	
					0,032	
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1060,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Powierzchnia skarp		$250,0 * (2,12 + 2,12)$	
					1060,000	
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1060,000	
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm ciekłu szer 0,80 m	metr	250,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1				
1	100	KNR 1501-01-08-02-01	Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,6 m namul głęb 1/2	metr	10,000	
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1				
1	160	KSNR S010-12-02-02-00	Studzienka kontrolna S-1 o 1000 głęb 2,0 m	szt	1,000	

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-06-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Jaszkowo-Ludwikowo
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr W-5-1
 Lokalizacja: Jaszkowo-Ludwikowo gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-06-001		Strona 1			18-12-2012	
SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
				Razem	6 169,85	
1	Konserwacja rowu W-5-1 L=250 mb					
1	10 WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,032	19 447,38	622,32	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000	
					R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170	
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170	
					S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie				11 439,63
	Razem	K. Pośr 70,0%				8 007,74
	Razem	Pozycja				19 447,38
1	20 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	1060,000	0,31	327,96	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820	
					R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie				0,18
	Razem	K. Pośr 70,0%				0,13
	Razem	Pozycja				0,31
1	30 KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	1060,000	0,10	100,91	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560	
					R	0,06
	Razem	K. Bezpośrednie				0,06
	Razem	K. Pośr 70,0%				0,04
	Razem	Pozycja				0,10
1	50 KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	250,000	7,81	1 951,60	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920	
					S	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie				4,59
	Razem	K. Pośr 70,0%				3,21
	Razem	Pozycja				7,81
1	100 KNR 1501-01-08-02-01 Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,6 m namul głęb 1/2	metr	10,000	47,60	476,00	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
	Robotnik budowlany	r-godz	2,00000	14,00	28,0000	
					R	28,00
	Razem	K. Bezpośrednie				28,00
	Razem	K. Pośr 70,0%				19,60
	Razem	Pozycja				47,60

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1 160	KSNR S010-12-02-02-00 Studzienka kontrolna S-1 ø 1000 głęb 2,0 m	szt	1,000		2 691,06
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	58,30000	14,00	816,2000
				R	816,20
	Kręgi betonowe ø 1000 L=500	szt	4,20000	121,00	508,2000
				M	508,20
	Koszty zakupu i transportu	%	10,000		50,8200
				T	50,82
	Ciągnik kołowy 50 KM	m-godz	1,46000	65,00	94,9000
	Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg	m-godz	1,44000	16,00	23,0400
	Koparko-ladowarka CASE	m-godz	4,00000	80,00	320,0000
				S	437,94
	Razem	K. Bezpośrednie			1 813,16
		K. Pośr 70,0%			877,90
	Razem	Pozycja			2 691,06
OGÓLEM KOSZTORYS 004-06-001					6 169,85



VII. Konserwacja rowu melioracyjnego nr R-A w m. Żabno gm.

Brodnica

Rozmiar rzeczowy ogółem: 3100mb

Roboty wykonywane w okresie od 26.06.2012r. do 31.07.2012r.

1.0 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Lp.	Zrealizowane cele merytoryczne	Jednostka miary	Ilość
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	m ²	657
2	Wykoszenie porostów ze skarp	m ²	13144
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	m ²	13144
4	Mechaniczne odmulenie	m	3100
5	Oczyszczenie przepustu	m	12

2.0 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Lp.	Rodzaj robót	Kwota w zł
1	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków gęstych	12776,93
2	Wykoszenie porostów ze skarp	4066,75
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	1251,31
4	Mechaniczne odmulenie	24199,84
5	Oczyszczenie przepustu	571,20
ŁĄCZNIE		42866,03

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-07-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
Obiekt: Spółka Wodna Żabno
Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
Lokalizacja: Żabno gm. Brodnica

Zamawiający: Gminna Spółka Wodna Brodnica
Wykonawca: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie

Poziomy cen:

poziom cen robót.....	Cennik robót tradycyjny IV kw 2007
poziom cen robocizny.....	Stawki budów kraj IV kw 07
stawka robocizny kalkulacyjnej.....	14,00
poziom cen materiałów.....	Ceny materiałów IV kw 2007 SOFTBUD
poziom cen sprzętu.....	Ceny sprzętu IV kw 2007 SOFTBUD
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....	70,0%

Wartość robót netto: **42 866,03**
Słownie: *czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć 03/100*

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 18-12-2012

PRZEDMIAR POWYKONAWCZY 004-07-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Żabno
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
 Lokalizacja: Żabno gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

PRZEDMIAR 004-07-001 Strona 1 18-12-2012

SYKAL-002265

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konserwacja rowu R-A L=3100 mb		
1	10	WKNR W201-01-09-01-00	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,657
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia krzaków do wycięcia		1550,0*(2,12+2,12)*0,0001
					0,657
1	20	KNR 1501-01-14-04-00	Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	13144,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Powierzchnia skarp		3100,0*(2,12+2,12)
					13144,000
1	30	KNR 1501-01-15-02-00	Wygrabienie wykosz porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	13144,000
1	50	KNR 1501-01-16-04-01	Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	3100,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			
1	100	KNR 1501-01-08-02-01	Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,6 m namul głębi 1/2	metr	12,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			

KOSZTORYS POWYKONAWCZY 004-07-001

Budowa: Gminna Spółka Wodna Brodnica 2012
 Obiekt: Spółka Wodna Żabno
 Rodzaj robót: Konserwacja rowu nr R-A
 Lokalizacja: Żabno gm. Brodnica
 Inwestor: Gminna Spółka Wodna Brodnica

KOSZTORYS 004-07-001		Strona 1			18-12-2012
DZ. POZ.	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Konserwacja rowu R-A L=3100 mb			Razem	42 866,03
1 10	WKNR W201-01-09-01-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych	HA	0,657	19 447,38	12 776,93
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	817,00000	14,00	11438,0000
				R	11 438,00
	Pila motorowa łańcuchowa 4,2 kM	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
	Podkrzesywarka	m-godz	0,08170	10,00	0,8170
				S	1,63
	Razem	K. Bezpośrednie			11 439,63
		K. Pośr 70,0%			8 007,74
	Razem	Pozycja			19 447,38
1 20	KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp porost gęsty twardy	m ²	13144,000	0,31	4 066,75
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,01300	14,00	0,1820
				R	0,18
	Razem	K. Bezpośrednie			0,18
		K. Pośr 70,0%			0,13
	Razem	Pozycja			0,31
1 30	KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykoszu porostów ze skarp szer ponad 2,0 m	m ²	13144,000	0,10	1 251,31
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,00400	14,00	0,0560
				R	0,06
	Razem	K. Bezpośrednie			0,06
		K. Pośr 70,0%			0,04
	Razem	Pozycja			0,10
1 50	KNR 1501-01-16-04-01 Mechaniczne odmulenie gr 40 cm cieku szer 0,80 m	metr	3100,000	7,81	24 199,84
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Koparka gąsienicowa JCB	m-godz	0,06560	70,00	4,5920
				S	4,59
	Razem	K. Bezpośrednie			4,59
		K. Pośr 70,0%			3,21
	Razem	Pozycja			7,81
1 100	KNR 1501-01-08-02-01 Oczyszczenie przepustu rurowego F1 0,6 m namul głęb 1/2	metr	12,000	47,60	571,20
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	2,00000	14,00	28,0000
				R	28,00
	Razem	K. Bezpośrednie			28,00
		K. Pośr 70,0%			19,60
	Razem	Pozycja			47,60

1957 - 1958

C



C

